

Adottata dal Direttore Generale in data - 8 LUG. 2004

OGGETTO: II^ FASE ART. 20 L. 67/88 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO SANITARIO DI S. ANTIOCO. NP 120
Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta BASE Impianti

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibera n° 1377 del 30.03.2001 è stato affidato all'Ing. Andrea Tronci, libero professionista, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con Convenzione d'incarico, rep. n° 25 del 16.05.2001 reg. a Iglesias il 22.05.2001 al n° 677, è stato stipulato il contratto che regola i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Andrea Tronci;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il geom. G. Aru quale responsabile di procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Delibera n° 3070 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'ing. A. Tronci, per un importo complessivo di € 154.937,07 (lit. 300.000.000);
- l'Accordo di programma Stato Regione inerente la II^ Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.2002, al NP 120 prevede un finanziamento di € 154.937,07 nell'esercizio 2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 1178 del 29.05.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,354% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco (CA);
- l'affidamento dei lavori alla ditta BASE Impianti è stato disposto con contratto rep. n° 184 in data 17.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1854 per un importo contrattuale di € 80.469,14 per lavori ed € 2471,50 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 1° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 14.06.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14.06.2004, lavori per un importo totale di € 34.685,16 al netto del ribasso offerto, di cui € 622,88 per oneri per la Sicurezza, come risulta dal 1° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 1, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 34.511,73 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 37.962,90.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento geom. G. Aru ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 56/2004 del 15.06.2004 di € 34.511,73 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 37.962,90 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE GENERALE


SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 1° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14.06.2004, lavori per un importo totale di € 34.685,16 al netto del ribasso offerto, di cui € 622,88 per oneri per la Sicurezza;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento geom. G. Aru ha regolarmente liquidato, con trasmissione al Servizio Bilancio, la fattura n° 56/2004 del 15.06.2004 di € 34.511,73 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 37.962,90 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 37.962,90, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 208000024 -immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add. *Valle*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 1653 del 8 LUG. 2004

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 LUG. 2004 al 26 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 5: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 56 del 15/06/04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di S.Antioco
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 14/06/2004

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97


COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

Contratto in data 17/10/2003 rep. n. 184 registrato a ^{IGLESIAS} in data 21/10/2003 ^{1854 mod.3} al n. di euro 82 940.64

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DI PERIZIA	106 313.56
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	48 623.51
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 677.05
Giorni Utili per Ultimazione:	0		0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__		
Giorni di Sospensione:	0		
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 DN.0003	VASO IGIENICO delle dimensioni di circa cm 48x36x39 in vetrochina bianca di prima scelta, messo in opera allettato con malta bastarda e completo di sedile in plastica pesante, sca ... nto ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	2.000	189.93	379.86
2 DN.0004	VASO IGIENICO MONOBLOCCO adatto all'uso dei portatori di HANDICAP delle dimensioni di circa 800x400x500(h) mm, in vetrochina bianca di prima scelta, del tipo Dolomite serie Atlanti ... compresi tutti gli oneri necessari per dare l'apparecchio perfettamente montato e funzionante. Contabilizzato ad unità. SOMMANO	2.000	565.40	1 130.80
3 DN.0005	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di cm 56x36x39, di prima scelta, allettato con malta bastarda, dato in opera completo di batteria comprendente gruppo monocomando a sba ... parecchio perfettamente funzionante e collegato alle rispettive linee di adduzione e scarico. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	1.000	192.45	192.45
4 DN.0006	LAVABO in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa cm 58x46, del tipo montato sospeso su mensola a muro (queste comprese) completo di batteria ... tegrato dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	2.000	183.19	366.38
5 DN.0007	LAVABO destinato all'uso dei portatori di HANDICAP, in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa 60x67 cm, in opera su mensola pneumatica regol ... ntegrata dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	2.000	360.61	721.22
6 DN.0009	KIT DI AUSILI PER BAGNO destinati ai portatori di HANDICAP, comprendente il corrimano da montarsi al fianco del vaso, in acciaio con rivestimento di nylon poliammide 6 autoestingue ... ide 6 autoestinguente diametro cm 3.5 e lunghezza cm 61.4, il tutto dato in opera montato secondo la normativa vigente. SOMMANO cadauno	2.000	358.70	717.40
7 DN.0025	RIPRISTINO DI INTONACI cementizi interni ed esterni. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco ammalorati o non aderenti alla sot ... per attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2	15.000	6.76	101.40
8 DN.0052	SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO DI APPARECCHIO RADIATORE. SOMMANO cadauno	2.000	12.62	25.24
9 DN.0055	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI INFISSO PORTA INTERNA in legno, di dimensioni 70-90 X 200-220. SOMMANO cadauno	5.000	15.17	75.85
10 DN.1020.104 0.01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... nferimento a discarica; valutato per la superficie effettiva per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10. SOMMANO m2	1.056	12.63	13.34
11 DN.1020.113 0.01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO INTERNO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto in ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni. SOMMANO m2	34.100	5.23	178.34
12 DN.1020.126 0.02	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: altri apparecchi igienici, scaldabagni, radiatori etc. SOMMANO ognuno	12.000	15.04	180.48
13 DN.1110.116 0.02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... , compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	5.093	14.02	71.40
14 DN.1200.109	INTONACO CIVILE LISCIO CEMENTIZIO PER INTERNI su superfici verticali o orizzontali, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frataz ... po R 32.5 per mc			
	A RIPORTARE			4 154.16

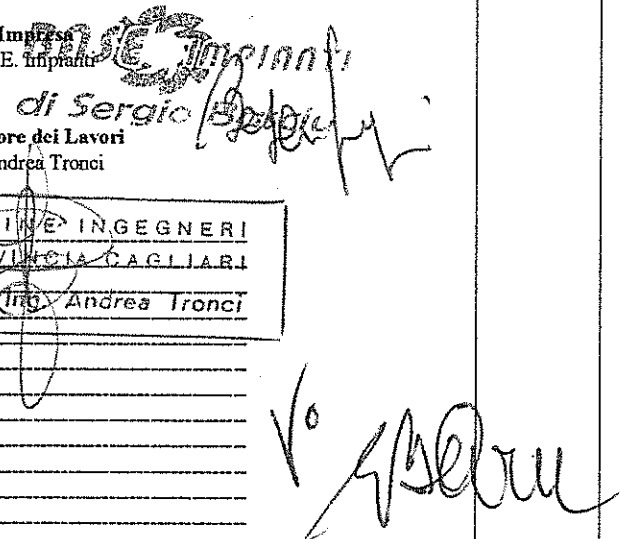Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 1'677.05 Incidenza Sicurezza - IS = 1'677.05 / 106'313.56 = 0.0157745634705488			
	LAVORI A CORPO euro			27 813.84
		<i>aliquota</i>		(36.323%)
	LAVORI A MISURA euro			6 248.44
	SOMMANO euro			34 062.28
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((34'062.28 / 91'709.71) * 1'677.05) = euro			622.88
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro			34 685.16
	TOTALE euro			34 685.16
	Data, 14/06/2004			
	L'Impresa BASE. Impianti <i>di Sergio</i> Il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Tronci			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dett. (Ing. Andrea Tronci) </div>			
				
	A RIPORTARE			

Comune di S.Antioco

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 34 511.73

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/10/2003 repertorio n. 184 registrato a in data 17/10/03 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0.00
anticipazione		0.00

Lavori e somministrazioni	34 685.16
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	34 685.16
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5% Recupero anticipazione	173.43
Ammontare dei certificati precedenti euro	0.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	173.43
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	34 511.73
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	34 511.73

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 34 511.73 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaquattromilacinquecentoundici virgola settantatre).

Data, 24.06.04



Il Responsabile del
Procedimento

[Handwritten signature]

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Tronci

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. Andrea Tronci

Trasmessa in ingegneria il 24.06.04

Riferimenti	
Fattura n.	56/2004
Data Fattura	15/06/2004

Cliente	
Nome	AZIENDA USL N.7 CARBONIA
Indirizzo	VIA DALMAZIA N.83
C.a.p.	09013 Città CARBONIA (CA)
P.IVA / C.F.	02261310920

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	1° S.A.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIO DI SANT'ANTIOCO, COME DA CONTRATTO REPERTORIO N.184 DEL 17/10/2003.	€ 34.511,73	€ 34.511,73

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
16 GIU 2004
PROT. 6382
CAT. CLAS. FATT

Imponibile	€	34.511,73
Spese di spedizione		
IVA 10%	€	3.451,17
TOTALE FATTURA	€	37.962,90


Modalità di pagamento	Accredito
Banca / filiale	BANCO DI SARDEGNA AG.2 VIA TIZIANO CAGLIARI
C/C	18036
ABI	01015 CAB 04802

cod. 020800024 (ex art. 20 L.67/88)
il resp. mac. G. B. ...

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1653 DEL 8 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

