



adottata dal Commissario Straordinario in data

11 NOV 2015

OGGETTO: *Lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. Approvazione e liquidazione Certificato di pagamento n° 4 al R.T.I. Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A..*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Regionale n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma del Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1602 del 26.11.2012 è stato disposto che l'intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, denominato "PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, CAMERA MORTUARIA, LABORATORIO ANALISI, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, può attuarsi nell'ambito dell'individuazione di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000, per la realizzazione dei lavori di completamento, per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori, oltreché la nomina dell'Ing. Brunello Vacca quale Responsabile del Procedimento del medesimo intervento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, oltreché quello di referente Aziendale dell'Accordo di Programma cui far riferimento in tutte le fasi dell'investimento programmato; -

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1067 del 25.06.2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, i lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, a favore della stessa Ditta aggiudicataria di cui alla Delibera n° 943/2012, per la realizzazione dei lavori previsti nel programma " Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 – prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. CTO di Iglesias finalizzati all'allestimento dei nuovi reparti Pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco Operatorio";

- che con Delibera del Direttore Generale n° 1447 del 21.08.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, predisposto dall'Ing. Cristian Cocco, dipendente sino alla data del 31.12.2013 di questa ASL n. 7 di Carbonia, per un importo complessivo di € 3.281.579,30, di cui: € 2.513.758,51 per lavori e € 767.820,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione a vale sul Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, codice intervento ASL 93 -12 -22b;

VISTO

il Contratto d'appalto per l'affidamento al R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.- Tepor S.p.A., dei lavori di che trattasi, Rep. n° 17 del 17.01.2014, registrato ad Iglesias in data 21.01.2014 al n° 128 Mod.3, per l'importo di € 2.513.785,51 di cui: € 2.460.759,20 per lavori e € 53.026,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO

- che con Deliberazione n. 1222 del 22 Luglio 2014 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo di € 638.900,00, compreso € 13.265,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;

- che con Deliberazione n. 1456 del 17 settembre 2014 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per un importo di € 612.900, compreso € 25.991,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;

- che con Deliberazione n. 634/C del 29 aprile 2015 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. per un importo di € 852.300,00 compreso € 43.682,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 10%;

- RECEPITO** che dagli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi in data 02.10.2015, acquisiti al Protocollo aziendale n. PG/2015/0022592 del 02.10.2015, il R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., hanno eseguito a tutto il 21 luglio 2015, lavori per un importo totale di € 2.659.686,80, come risulta dal 4^a S.A.L. che si allega in copia;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n° 4, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A., la somma di € 594.100,00 compreso € 51.818,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- VISTE** le fatture:
- n° 13 del 26.10.2015 dell'importo di € 432.769,56 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l.
- n° 000082/15 del 28.10.2015 dell'importo di € 161.330,44 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A.
- CONSIDERATO** che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Tepor S.p.A.;
- DATO ATTO** -che la Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. On Line, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;
-che la Ditta Tepor S.p.A. risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. On Line, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 4^a S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 02.10.2015 e acquisti al Protocollo aziendale al n. PG/2015/0022592 del 02.10.2015, nonché il Certificato di Pagamento n° 4 dell'importo di € 594.100,00 compreso € 51.818,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 20 ottobre 2015;
- di liquidare le fatture nn°: 13 del 26.10.2015 dell'importo di € 432.769,56 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000082/15 del 28.10.2015 dell'importo di € 161.330,44 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alle spettanze inerenti il 4^a S.A.L.;

Il Commissario Straordinario

- DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
- SENTITO** il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 4^a S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Luigi Carosi in data 02.10.2015 e acquisti al Protocollo aziendale al n. PG/2015/0022592 del 02.10.2015, nonché il Certificato di Pagamento n° 4 dell'importo di € 594.100,00 compreso € 51.818,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 20 ottobre 2015;



- la liquidazione delle fatture nn°: 13 del 28.10.2015 dell'importo di € 432.769,56 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000082/15 del 28.10.2015 dell'importo di € 161.330,44 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alle spettanze inerenti il 4^a S.A.L. ;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture nn°: 13 del 28.10.2015 dell'importo di € 432.769,56 + IVA al 10%, emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 000082/15 del 28.10.2015 dell'importo di € 161.330,44,00 + IVA al 10% emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relative alle spettanze inerenti il 4^a S.A.L, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 653.510,00 compreso € 51.818,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% e al netto delle prescritte ritenute di legge, sulla classe di costo al al Codice A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso" a valere sul Fondo di di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, codice intervento ASL 93 – 12 -22b, al Centro di Costo n° 10510207.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Piitau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvia Maggetti

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut , Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento/ Ing. Brunello VACCA

Add/ Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1083/C del 11 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A circular stamp from the Servizio Affari Generali of ASL n. 7 Carbonia, Regione Toscana. The stamp contains the text "SERVIZIO AFFARI GENERALI", "ASL N. 7 CARBONIA", and "REGIONE TOSCANA". A handwritten signature is written over the stamp.

Allegati n. **06**

All. 01

Rtp. Auteri & Carosi

CAGLIARI - Via de Gioannis n. 25 - 09127 - tel.fax. 070/341394 - 070/3481712 - e-mail: ing.luigicarosi@libero.it
CARBONIA - Via Gramsci n. 115 - 09013 - tel. 0781/61719 - fax. 0781/63199 - e-mail: auteristudio@tiscali.it

ASL 7

PG/2015/ 0022592 del 02/10/2015 ore 12,14

Mittente: INGEGNER LUIGI CAROSI

Assegnatario: Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica: 1.4.12 Fascicolo: 1 del 2015



Spett.le
AUSL 7 CARBONIA
c.a.: Dott. Ing. Brunello Vacca
Responsabile Unico Procedimento
Ufficio Tecnico - Asl 7 Carbonia

Cagliari 02.10.2015


Oggetto: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.5, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias -Blocco operatorio- Perizia suppletiva e di variante n° 1.
Trasmissione IV SAL

In allegato Vi trasmettiamo il IV Sal dei lavori in oggetto secondo le rettifiche somministrate.

Distinti Saluti

Il direttore dei lavori

Dott. Ing Luigi Carosi



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 21/07/2015

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

Contratto in data 17/01/2014 rep. n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 di euro 2 513 785.51

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 990 057.45
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	55 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	2 990 057.45
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	55 000.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

V. rigo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'822'964,63 - 100%)					
1 ASC.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO: Ascensore avente portata 1150kg; capienza 15 persone; Velocità1,00 m/s; Corsa9,00m; 4 fermate e 4 servizi ... normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13). Dimensioni vano:1930 mm larghezza x 3050 mm profondità.	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	117'482,17 (4,162%)	117'482,17 (4,162%)
2 BO.I.AI.002	PREZZO A CORPO PER LA RIMOZIONE ED IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO RETE ESTERNA E COLLEGAMENTI BLOCCO OPERATORIO CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di n° 2 GRUPP ... in opera di 50 m circa di TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman DN 2" 1/2; come risulta dalle TAVV. IM 05-06-07-08.	SOMMANO a corpo aliquote	0,80	25'214,56 (0,893%)	20'171,65 (0,715%)
3 BO.I.CDZ.00 1	PREZZO A CORPO PER L'INSERZIONE DEL RADDOPPIO IMPIANTO DI VENTILAZIONE U.T.A. SALE OPERATORIE CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di n° 1 VENTILATORE MANDATA AERMEC V= 800 ... se spessore 32 mm.; fornitura e posa in opera di n° 1 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO; come risulta dalla TAV. IM 03.	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	28'294,12 (1,002%)	28'294,12 (1,002%)
4 BO.I.CDZ.00 2	PREZZO A CORPO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE PENSILE E RILEVATORI FUMI CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di n° 1 ventilconvettore pensile; fornitura e posa in opera di n° 3 rilevatore di fumo ottico	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	988,52 (0,035%)	988,52 (0,035%)
5 BO.I.ELE.00 1	PREZZO A CORPO PER COMPENSO DEI MAGGIORI ONERI PER SPOSTAMENTO BATTERIE NEL NUOVO LOCALE REALIZZATO AL PIANO SOTTOLIVELLO CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di 20 m circ ... W in con modulo d'emergenza; fornitura e posa in opera di n° 1 PLAFONE GRUPPO AUT. EMERG; come risulta dalla TAV. IM 04.	SOMMANO a corpo aliquote	0,93	21'775,00 (0,771%)	20'250,75 (0,717%)
6 BO.I.ELE.00 2	PREZZO A CORPO PER LA MAGGIORAZIONE PER L'UTILIZZO DI CAVI RESISTENTI AL FUOCO CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di 1010m circa di CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME con barr ... 169,72m circa di CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME con barriera antifluco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV 5x6mmq	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	16'600,48 (0,588%)	16'600,48 (0,588%)
7 BO.I.ELE.00 3	DETRAZIONE DA APPLICARE PER IL MINORE ONERE ALLA VOCE A CORPO ELE.NUOVO.005 CONSISTENTE IN: A) Compenso a corpo non erogato per la fornitura e posa in opera di gruppo statico di co ... uità da 40 kVA secondo quanto disposto con O. di S. n° 1 ed erogato quale compenso per i lavori impiantistici aggiuntivi	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	-48'654,45 (-1,724%)	-48'654,45 (-1,724%)
8 BO.I.GM.00 1	PREZZO A CORPO PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI: A) Maggior compenso per la fornitura e posa in opera di n° 1quadro riduzione II° stadio a 5 gas +1, in cas ... ssetta da incasso: idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio; come risulta dalle TAVV. IM 01-02.	SOMMANO a corpo aliquote	0,85	28'190,77 (0,999%)	23'962,15 (0,849%)
9 BO.OE.001	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI NECESSARIE PER GLI ADEGUAMENTI E LE VARIANTI PLANIMETRICHE NEGLI SPAZI OPERATIVI, CONSISTENTI IN: A) FORNITURA E POSA IN OPER ... e REI L20 con maniglione antipânico. E) FORNITURA E POSA IN OPERA DI rivestimento in pvc per circa 46,60 metri quadrati.	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	17'134,78 (0,607%)	17'134,78 (0,607%)
10 BO.OE.ALL. 001	PREZZO A CORPO DELLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO URBANO CONSISTENTI IN : A) N° 1 ALLACCIO FOGNARIO URBANO ACQUE BIANCHE realizzato con tubo in PVC SN4 F ... re, esclusi solamente lo scavo, il reinterro e l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale.	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	8'443,36 (0,299%)	8'443,36 (0,299%)
A RIPORTARE					
					204'673,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			204'673,53
11 BO.OE.CRN .001	PREZZO A CORPO PER LA SOSTITUZIONE, DELLE CORNICI IN TRAVERTINO CON ELEMENTI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO ARMATO A FACCIA VISTA E RICOSTRUZIONE DEI SUPPORTI MURARI SU N° 8 APERTURE ... orniture e posa in opera di cornice per ornamento di vano finestra in cls armato a faccia vista per complessivi 60,80 m SOMMANO a corpo aliquote	1,00	17'665,38 (0,626%)	17'665,38 (0,626%)
12 BO.OE.DISI NF.001	PREZZO A CORPO DELLE OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI: A) vasca di clorazione monoblocco prefabbricata in calcestruzzo armato dim. 170 x 250 x h210cm, a p ... di sodio dal serbatoio di stoccaggio e l'immissione, in dosi e tempi determinati, all'interno del serbatoio di contatto SOMMANO a corpo aliquote	1,00	24'391,92 (0,864%)	24'391,92 (0,864%)
13 BO.OE.RS.0 01	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE DI SCARICO ESTERNE DELLE ACQUE BIANCHE E DELLE ACQUE NERE CONSISTENTI IN: A) Demolizione e asportazione parziale di 263m2 circ ... forme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401; come dettagliato negli elaborati grafici TAVV. IM 07-08. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	134'049,76 (4,749%)	134'049,76 (4,749%)
14 BO.OE.UPS. 001	PREZZO A CORPO PER LE OPERE EDILI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOCALE UPS E CONSISTENTI IN: A) Realizzazione di aperture in breccia su manufatto in c.a. per circa 2,40 m ... a la struttura metallica di sostegno per circa 29,38 metri quadrati e come dettagliato nell'elaborato grafico TAV. ED01. SOMMANO a corpo aliquote	0,98	24'466,06 (0,867%)	23'976,74 (0,849%)
15 CDZ.NUOV O.001	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,95	211'036,82 (7,476%)	200'484,97 (7,102%)
16 CDZ.NUOV O.002	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W - umidificatore a vapore 60 kg/h. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,98	113'687,26 (4,027%)	111'413,52 (3,947%)
17 CDZ.NUOV O.003	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	129'128,39 (4,574%)	129'128,40 (4,574%)
18 CDZ.NUOV O.004	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa ... tavole ET-01a-C, ET-01b-c, ET-01c-C.. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	130'446,88 (4,621%)	130'446,88 (4,621%)
19 ELE.NUOV O.001	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (QGS01-2), come da schema quad ... mpreso cablaggio ed installazione come meglio definito nelle tavole EE-03-C, EE-04-C. Compreso ogni onere e magistero. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	44'365,76 (1,572%)	44'365,76 (1,572%)
20 ELE.NUOV O.002	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)MI 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario. SOMMANO a corpo aliquote	0,98	121'623,92 (4,308%)	119'191,44 (4,222%)
	A RIPORTARE			1'139'788,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'139'788,30
21 ELE.NUOV O.003	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per ambienti asettici, con ... nelle tavole EE-01c-C. Completo di accessori per il montaggio e stopper di bloccaggio. Compreso ogni onere e magistero. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	58'092,34 (2,058%)	58'092,34 (2,058%)
22 ELE.NUOV O.004	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI FRUTTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO ALIMENTAZIONE dato in opera completo di conduttori unipo ... o, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A come meglio definito nelle tavole EE-01a-C, EE-01b-C, EE-01c-C. SOMMANO a corpo aliquote	0,80	50'854,05 (1,801%)	40'683,24 (1,441%)
23 ELE.NUOV O.006	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, PER: A) Posa in opera di pannello di controllo e allarme sorvegliatore a 220 V, completo di scatola da incasso. ... entrate, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,90	22'910,43 (0,812%)	20'619,38 (0,730%)
24 ELE.NUOV O.007	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,80	9'444,36 (0,335%)	7'555,49 (0,268%)
25 ELE.NUOV O.008	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TERRA, compreso ogni onere e magistero, per: A) Fornitura e posa in opera di impianto per l'equalizzazione del potenziale nel n ... passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq per circa 400 m come meglio definito nella tavola EE-02-C. SOMMANO a corpo aliquote	0,90	10'395,22 (0,368%)	9'355,70 (0,331%)
26 ELE.NUOV O.009	IMPIANTO ELETTRICO, REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI DELLA CABINA MT/BT, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO. Prezzo a corpo per la sistemazione il cablaggio ed il materiale occorrente ... istente, per il collegamento al nuovo presidio ospedaliero come meglio definito nelle tavole EE-01-C, EE-02-C, EE-03-C. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	7'717,24 (0,273%)	7'717,24 (0,273%)
27 GAS.001	IMPIANTO GAS MEDICALI. FORNITURA DISPOSITIVI MEDICALI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTI IN: A) PRESE PER VARI GAS PER INSTALLAZIONE SU TESTA-LETTO Fornitura e posa in ... 0 Hz, attacco scarico/aspirazione GI. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	0,95	89'135,52 (3,158%)	84'678,74 (3,000%)
28 I.ELE.ILS.00 1	IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	21'378,52 (0,757%)	21'378,52 (0,757%)
29 OE.COL.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI PER: A) Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante esterno a parete realizzato median ... r, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm SOMMANO a corpo aliquote	1,00	54'458,99 (1,929%)	54'458,99 (1,929%)
30 OE.CONT.0 01	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, per circa ... mpleto di filtri assoluti, dim. 1440x1900mm-2465mc/h a 0,25m/s nella misura riscontrabile dalla tavola EA-04-C e ET-01-C SOMMANO a corpo aliquote	1,00	142'609,69 (5,052%)	142'609,69 (5,052%)
31 OE.DEM.00 1	OPERE EDILI DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm e per circa ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO a corpo aliquote	1,00	47'854,76 (1,695%)	47'854,76 (1,695%)
	A RIPORTARE			1'634'792,39

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'634'792,39
32 OE.IDR.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	26'559,34 (0,941%)	26'559,34 (0,941%)
33 OE.INF.EST. 001	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER: SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, CO ... e murarie e la registrazione dell'infisso e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	11'978,75 (0,424%)	11'978,75 (0,424%)
34 OE.INF.INT. 001	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... lla tavola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	80'809,64 (2,863%)	80'809,64 (2,863%)
35 OE.INT.TIN. 001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTONCI E TINTEGGIATURE, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, per circa 1800 mq e per ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali SOMMANO a corpo aliquote	1,00	90'171,95 (3,194%)	90'171,95 (3,194%)
36 OE.MET.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO METEORICO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm SOMMANO a corpo aliquote	1,00	1'705,07 (0,060%)	1'705,07 (0,060%)
37 OE.MUR.00 1	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI MURATURE PER: A) Ripristino dello strato corticale di superfici in c.a. o acciaio in stato di incipiente degrado negli ambienti vesti ... e, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30 SOMMANO a corpo aliquote	1,00	106'133,13 (3,760%)	106'133,13 (3,760%)
38 OE.OPER.00 1	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... la tavola EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. SOMMANO a corpo aliquote	0,99	458'796,51 (16,252%)	454'208,54 (16,090%)
39 OE.PON.001	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'APPROVVIGIONAMENTO E POSA DI ATTREZZATURE PER I LAVORI IN QUOTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Nolo mensile (o per frazione di mese) di pont ... ti realizzati in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm, per circa 1300 mq, come meglio descritta nella tavola EA-01-C. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	9'957,66 (0,353%)	9'957,66 (0,353%)
40 OE.PR.001	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI pavimento in PVC con trattamento PURE EVERC ... a tavola EA-04-C Compreso incollaggio dei paraspigoli e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	187'396,58 (6,638%)	187'396,58 (6,638%)
41 OE.VM.001	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI E MASSETTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 2 cm e p ... necessaria per l'irrigidimento del Massetto di cui alla voce B e come meglio misurabile nella tavola EA-01-C e EA-02-C. SOMMANO a corpo aliquote	1,00	55'973,75 (1,983%)	55'973,75 (1,983%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			2'659'686,80 (94,216%)
	A R I P O R T A R E			2'659'686,80

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. A) D. Lgs. N. 163/2006, di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Blocco operatorio.

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. DCG srl-TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 594'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/07/2014	638'900,00
2	10/09/2014	612'900,00
3	24/03/2015	852'300,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		2'104'100,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,


VISTO: il Contratto in data 17/01/2014 repertorio n. 17 registrato a Carbonia in data 17/01/2014 al n. 17 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'659'686,80
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'659'686,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	51'818,85
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	51'818,85
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	13'298,43
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'104'100,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'117'398,43
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	594'100,00
per I.V.A. al 10%	59'410,00
TOTALE GENERALE euro	653'510,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 594'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro cinquecentonovantaquattromilacenti/00).

Iglesias, 20 ottobre 2015

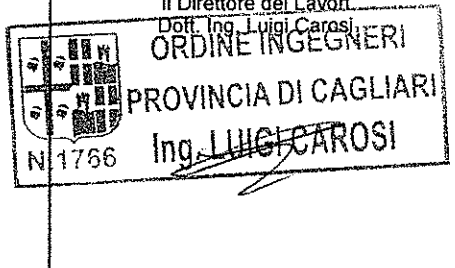

Il Responsabile del
 Procedimento
 Dott. Ing. Brunello Vacca

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'822'964,63 - 100%)								
45 OE.CONT.0 01 08/07/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, per circa ... mpleto di filtri assoluti, dim. 1440x1900mm-2465mc/h a 0,25m/s nella misura riscontrabile dalla tavola EA-04-C e ET-01-C <i>(voce pari a euro 142'609,69 - 5,052% dei lavori a corpo)</i>					0,30		
SOMMANO a corpo aliquota						0,30 (1,516%)		
46 OE.IDR.001 08/07/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo appa ... samento di murature di qualunque tipo, e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160. <i>(voce pari a euro 26'559,34 - 0,941% dei lavori a corpo)</i>					0,40		
SOMMANO a corpo aliquota						0,40 (0,376%)		
47 OE.INF.INT. 001 08/07/2015	OPERE EDILI, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) MANIGLIONE ANTIPANICO, come meglio misurabili nella tavola EA-05-C, completo pronto al mont ... lla tavola EA-05-C, compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. <i>(voce pari a euro 80'809,64 - 2,863% dei lavori a corpo)</i>					0,20		
SOMMANO a corpo aliquota						0,20 (0,573%)		
48 OE.OPER.00 1 08/07/2015	OPERE EDILI CONSISTENTI NELL'ALLESTIMENTO DI SALE OPERATORIE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, ED IN PARTICOLARE: A) Sistema per la ripresa aria in sala operatoria realizzato in ac ... la tavola EE-01b-C. Compreso qualsiasi altro onere e magistero dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge. <i>(voce pari a euro 458'796,51 - 16,252% dei lavori a corpo)</i>					0,09		
SOMMANO a corpo aliquota						0,09 (1,463%)		
49 OE.PR.001 08/07/2015	OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI pavimento in PVC con trattamento PURE EVERC ... a tavola EA-04-C Compreso incollaggio dei paraspigoli e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>(voce pari a euro 187'396,58 - 6,638% dei lavori a corpo)</i>					0,40		
SOMMANO a corpo aliquota						0,40 (2,655%)		
50	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
BO.OE.001 17/07/2015	EDILI NECESSARIE PER GLI ADEGUAMENTI E LE VARIANTI PLANIMETRICHE NEGLI SPAZI OPERATIVI, CONSISTENTI IN: A) FORNITURA E POSA IN OPER ... e REI 120 con maniglione antipanico. E) FORNITURA E POSA IN OPERA DI rivestimento in pvc per circa 46,60 metri quadrati. <i>(voce pari a euro 17'134,78 - 0,607% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,607%)</i>		
51 BO.OE.ALL. 001 17/07/2015	PREZZO A CORPO DELLE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO URBANO CONSISTENTI IN : A) N° 1 ALLACCIO FOGNARIO URBANO ACQUE BIANCHE realizzato con tubo in PVC SN4 F ... re, esclusi solamente lo scavo, il reinterro e l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale. <i>(voce pari a euro 8'443,36 - 0,299% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,299%)</i>		
52 BO.OE.CRN 001 17/07/2015	PREZZO A CORPO PER LA SOSTITUZIONE, DELLE CORNICI IN TRAVERTINO CON ELEMENTI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO ARMATO A FACCIA VISTA E RICOSTRUZIONE DEI SUPPORTI MURARI SU N° 8 APERTURE ... ornitura e posa in opera di cornice per ornamento di vano finestra in cls armato a faccia vista per complessivi 60,80 m <i>(voce pari a euro 17'665,38 - 0,626% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,626%)</i>		
53 BO.OE.DISI NF.001 17/07/2015	PREZZO A CORPO DELLE OPERE EDILI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI: A) vasca di clorazione monoblocco prefabbricata in calcestruzzo armato dim. 170 x 250 x h210cm, a p ... di sodio dal serbatoio di stoccaggio e l'immissione, in dosi e tempi determinati, all'interno del serbatoio di contatto <i>(voce pari a euro 24'391,92 - 0,864% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,864%)</i>		
54 BO.OE.RS.0 01 17/07/2015	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE DI SCARICO ESTERNE DELLE ACQUE BIANCHE E DELLE ACQUE NERE CONSISTENTI IN: A) Demolizione e asportazione parziale di 263m2 circ ... forme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401; come dettagliato negli elaborati grafici TAVV. IM 07-08. <i>(voce pari a euro 134'049,76 - 4,749% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(4,749%)</i>		
55 BO.OE.UPS. 001 17/07/2015	PREZZO A CORPO PER LE OPERE EDILI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOCALE UPS E CONSISTENTI IN: A) Realizzazione di aperture in breccia su manufatto in c.a. per circa 2,40 m ... a la struttura metallica di sostegno per circa 29,38 metri quadrati e come dettagliato nell'elaborato grafico TAV. ED01.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	(voce pari a euro 24'466,06 - 0,867% dei lavori a corpo)					0,98		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,98 (0,849%)		
56 GAS.001 21/07/2015	IMPIANTO GAS MEDICALI. FORNITURA DISPOSITIVI MEDICALI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTI IN: A) PRESE PER VARI GAS PER INSTALLAZIONE SU TESTA-LETTO Fornitura e posa in ... 0 Hz, attacco scarico/aspirazione G1. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (voce pari a euro 89'135,52 - 3,158% dei lavori a corpo)					0,10		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,10 (0,316%)		
57 ELE.NUOV O.001 21/07/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (QGS01-2), come da schema quad ... mpreso cablaggio ed installazione come meglio definito nelle tavole EE-03-C , EE-04-C. Compreso ogni onere e magistero. (voce pari a euro 44'365,76 - 1,572% dei lavori a corpo)					0,10		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,10 (0,157%)		
58 ELE.NUOV O.002 21/07/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI LINEE ELETTRICHE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV ... ro tubazioni FK15 o su apposite passerelle - scatole di derivazione, accessori di montaggio e quanto altro necessario (voce pari a euro 121'623,92 - 4,308% dei lavori a corpo)					0,08		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,08 (0,345%)		
59 ELE.NUOV O.003 21/07/2015	IMPIANTO ELETTRICO. FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per ambienti asettici, con ... nelle tavole EE-01c-C. Completo di accessori per il montaggio e stopper di bloccaggio. Compreso ogni onere e magistero. (voce pari a euro 58'092,34 - 2,058% dei lavori a corpo)					0,50		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,50 (1,029%)		
60 ELE.NUOV O.007 21/07/2015	IMPIANTO ELETTRICO, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO, PER: A) Fornitura e posa in opera di un impianto interfonico compatto tra la sala operatoria ed il locale c ... preso di tutto il necessario per l'installazione dalla centrale al punto e cablaggio a regola d'arte. (voce pari a euro 9'444,36 - 0,335% dei lavori a corpo)					0,20		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,20 (0,067%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


PAG. 3 DI 6

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
61 ELE.NUOV O.009 21/07/2015	<p>IMPIANTO ELETTRICO, REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI DELLA CABINA MT/BT, COMPRESO OGNI ONERE E EMAGISTERO. Prezzo a corpo per la sistemazione il cablaggio ed il materiale occorrente ... istente, per il collegamento al nuovo presidio ospedaliero come meglio definito nelle tavole EE-01-C, EE-02-C, EE-03-C.</p> <p><i>(voce pari a euro 7'717,24 - 0,273% dei lavori a corpo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquota</i></p>					1,00		
						1,00 <i>(0,273%)</i>		
62 I.ELE.ILS.00 1 21/07/2015	<p>IMPIANTO ELETTRICO - FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, CONSISTENTE IN. A) Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza per l ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.</p> <p><i>(voce pari a euro 21'378,52 - 0,757% dei lavori a corpo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquota</i></p>					0,40		
						0,40 <i>(0,303%)</i>		
63 CDZ.NUOV O.001 21/07/2015	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORGANI DI DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) VAL ... dell'aria a doppia flangia, linee di collegamento ed accessori per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>(voce pari a euro 211'036,82 - 7,476% dei lavori a corpo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquota</i></p>					0,05		
						0,05 <i>(0,374%)</i>		
64 CDZ.NUOV O.002 21/07/2015	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FORNITURA E POSA DI CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, PER: A) Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria (CTA 1 ... W - umidificatore a vapore 60 kg/h. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>(voce pari a euro 113'687,26 - 4,027% dei lavori a corpo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquota</i></p>					0,08		
						0,08 <i>(0,322%)</i>		
65 CDZ.NUOV O.003 21/07/2015	<p>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO, DI: A) Fornitura e posa in opera di regolatore d'aria a ... ta sezione e formazione per l'alimentazione delle apparecchiature descritte sopra. Compreso ogni onere e magistero.</p> <p><i>(voce pari a euro 129'128,39 - 4,574% dei lavori a corpo)</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquota</i></p>					0,20		
						0,20 <i>(0,915%)</i>		
66	PREZZO A CORPO PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
BO.I.GM.00 1 21/07/2015	DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI: A) Maggior compenso per la fornitura e posa in opera di n° 1 quadro riduzione II° stadio a 5 gas +1, in cas ... ssetta da incasso: idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio; come risulta dalle TAVV. IM 01-02. <i>(voce pari a euro 28'190,77 - 0,999% dei lavori a corpo)</i>					0,85		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,85 <i>(0,849%)</i>		
67 BO.I.ELE.00 1 21/07/2015	PREZZO A CORPO PER COMPENSO DEI MAGGIORI ONERI PER SPOSTAMENTO BATTERIE NEL NUOVO LOCALE REALIZZATO AL PIANO SOTTOLIVELLO CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di 20 m circ ... W in con modulo d'emergenza; fornitura e posa in opera di n° 1 PLAFONE GRUPPO AUT. EMERG; come risulta dalla TAV. IM 04. <i>(voce pari a euro 21'775,00 - 0,771% dei lavori a corpo)</i>					0,93		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					0,93 <i>(0,717%)</i>		
68 BO.I.ELE.00 2 21/07/2015	PREZZO A CORPO PER LA MAGGIORAZIONE PER L'UTILIZZO DI CAVI RESISTENTI AL FUOCO CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di 1010m circa di CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME con barr ... 169,72m circa di CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME con barriera antifluoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV 5x6mmq <i>(voce pari a euro 16'600,48 - 0,588% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(0,588%)</i>		
69 BO.I.ELE.00 3 21/07/2015	DETRAZIONE DA APPLICARE PER IL MINORE ONERE ALLA VOCE A CORPO ELE.NUOVO.005 CONSISTENTE IN: A) Compenso a corpo non erogato per la fornitura e posa in opera di gruppo statico di co ... uità da 40 kVA secondo quanto disposto con O. di S. n° 1 ed erogato quale compenso per i lavori impiantistici aggiuntivi <i>(voce pari a euro -48'654,45 - -1,724% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(-1,724%)</i>		
70 BO.I.CDZ.00 1 21/07/2015	PREZZO A CORPO PER L'INSERZIONE DEL RADDOPPIO IMPIANTO DI VENTILAZIONE U.T.A. SALE OPERATORIE CONSISTENTE IN: A) Fornitura e posa in opera di n° 1 VENTILATORE MANDATA AERMEC V= 800 ... se spessore 32 mm.; fornitura e posa in opera di n° 1 SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO; come risulta dalla TAV. IM 03. <i>(voce pari a euro 28'294,12 - 1,002% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	SOMMANO a corpo <i>aliquota</i>					1,00 <i>(1,002%)</i>		
71 BO.I.CDZ.00 2 21/07/2015	PREZZO A CORPO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE PENSILE E RILEVATORI FUMI CONSISTENTI IN: A) Fornitura e posa in opera di n° 1 ventilconvettore pensile; fornitura e posa in opera di n° 3 rilevatore di fumo ottico <i>(voce pari a euro 988,52 - 0,035% dei lavori a corpo)</i>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PAG. 5 di 6

A11.05

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	02/11/2015	A7_A1 - 2015 - 13485	28/10/2015	000082/15	12528 - TEPOR S.P.A.	177 463,48

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	29/12/2015	177 463,48	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avanz.
2015	96533	1	02/11/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		177 463,48
2015	96533	2	02/11/2015	2-A507010101-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	177 463,48	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Impugnabile	Importo
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	161 330,44	16 133,04

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
C.F. e P.IVA 02261310920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia

All.06

http://
Email :
Tel : (+39) 07816681

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fom.	28/10/2015	A7_A1 - 2015 - 13364	26/10/2015	13	747601 - DENTONI COSTRUZIONI	476 046,52

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	26/12/2015	476 046,52	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Data	Avere
2015	95489	1	28/10/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		476 046,52
2015	95489	2	28/10/2015	2-A102020801-Immobilizzazioni materiali in corso	476 046,52	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Importo
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	432 769,56	43 276,96
